



COMUNE DI FIRENZE

Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia



Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE TRANVIARIE 2 E 3 (1° lotto)

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA 2 PERETOLA - PIAZZA DELLA LIBERTÀ'

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OPERE PROPEDEUTICHE CANTIERE A.1

PROGETTAZIONE SOTTOSERVIZI:



ARCHITECTNA ENGINEERING s.r.l.

PROGETTAZIONE LINEA TRANVIARIA:



A. T. I. PER LA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO
LINEE 2 E 3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO

IL PROGETTISTA

COMMESSA

006

FASE

PS

COMPARTO

GEN

DOCUMENTO

SK001

REV.

0

SCALA




NOME FILE

PS-GEN-SK-001-0.dwg

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	28/10/2011	EMISSIONE DEFINITIVA			
1					
2					

CRONOPROGRAMMA - Tramvia di Firenze - Linee 2 e 3 1° lotto - Stralci o opere propedeutiche cantiere A.1

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2012																							
					novembre						dicembre						gennaio				febbraio				m			
					7/1	4/1	1/1	7/1	4/1	1/1	8/1	5/1	2/1	9/1	6/1	2/0	9/0	6/0	3/0	0/0	6/0	3/0	0/0	7/0				
1																												
2	Consegna Aree 1° fase	0 g	ven 04/11/11	ven 04/11/11																								
3	Cantiere A.1 Lavori propedeutici (Stralcio)	65 g	sab 05/11/11	gio 02/02/12																								
4	Rilievi area ex fondiaria	3 g	sab 05/11/11	mar 08/11/11																								
5	Cantierizzazione 1° fase	30 g	sab 05/11/11	gio 15/12/11																								
6	Spostamento SSV interferenti (Interramento linea aerea Telecom)	15 g	gio 24/11/11	mer 14/12/11																								
7	Bonifica BCM Superficiale e Profonda 1° fase	35 g	sab 05/11/11	gio 22/12/11																								
8	Istanza ed ottenimento autorizzazione estensione bonifica Superficiale da GM	25 g	ven 18/11/11	gio 22/12/11																								
9	Istanza e rilascio ordinanza chiusura inversione Viale Guidoni	24 g	lun 14/11/11	gio 15/12/11																								
10	Consegna Aree 2° fase	0 g	gio 15/12/11	gio 15/12/11																								
11	Cantierizzazione 2° fase	25 g	ven 16/12/11	gio 19/01/12																								
12	Bonifica BCM Superficiale e Profonda 2° fase	30 g	ven 23/12/11	gio 02/02/12																								
13	Verifiche e rilascio collaudo bonifica aree da Genio Militare	15 g	ven 03/02/12	gio 23/02/12																								

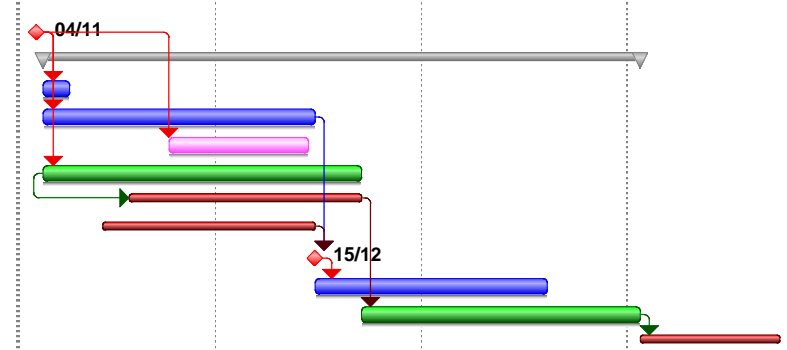

Progetto: Cronopro Stalcio A.1
Data: mar 01/11/11

Attività		Cardine		Attività esterne	
Divisione		Riepilogo		Cardine esterno	
Avanzamento		Riepilogo progetto		Scadenza	
