

2019_ZV02
ITI L: Da Vinci - Realizzazione biennio

Direzione	SERVIZI TECNICI	Direttore	MAZZONI MICHELE	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI	Dirigente	DREONI ALESSANDRO	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

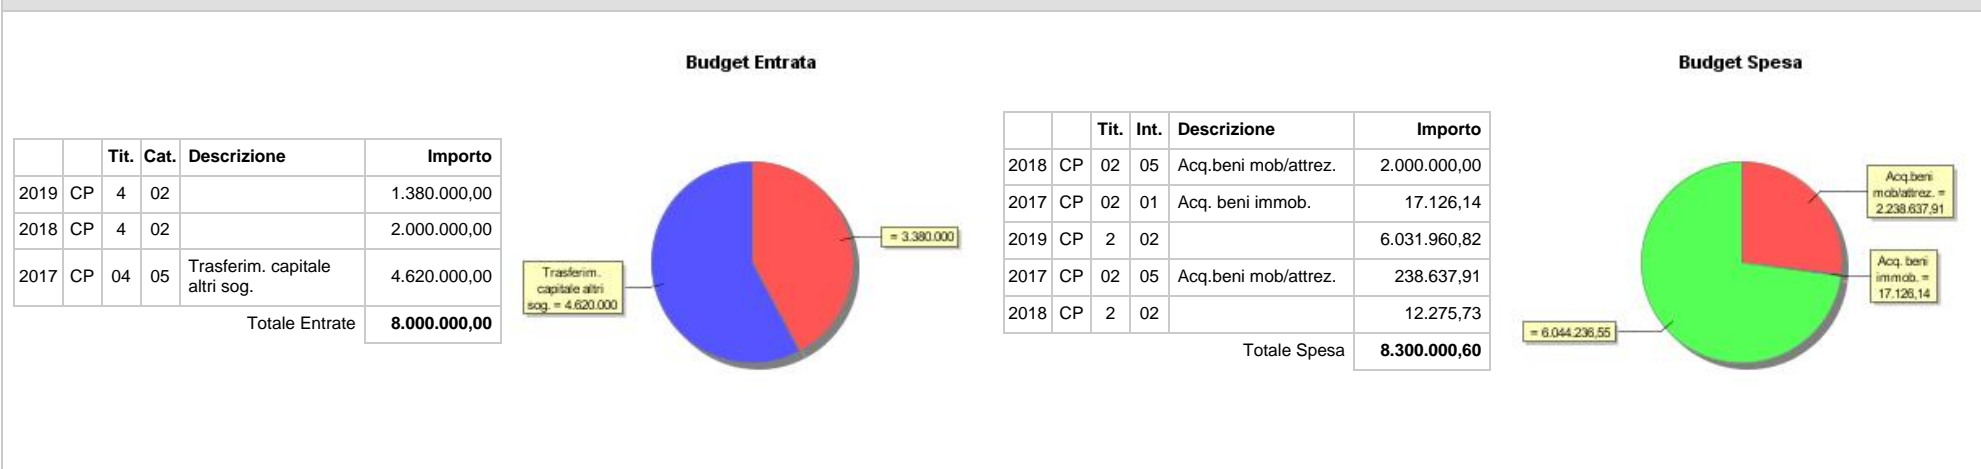
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_01 CITTA' PER SCUOLA E GIOVANI

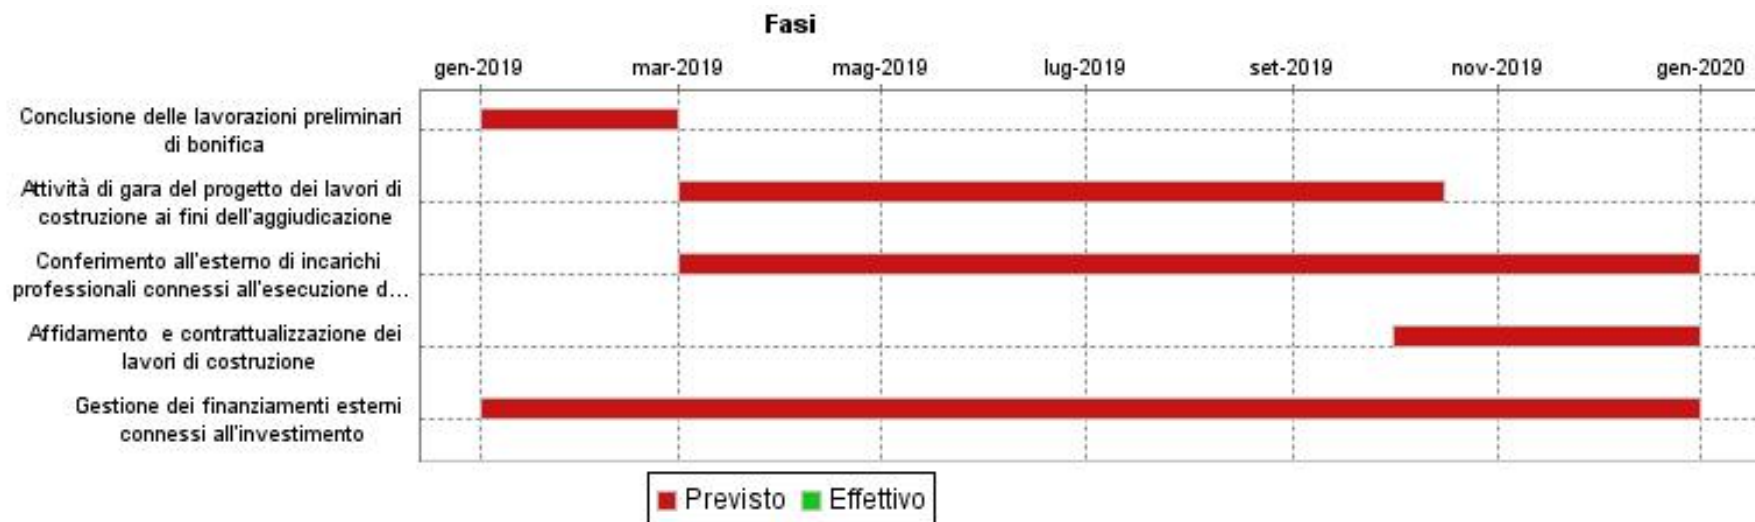
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_01IS_OB_STR_07 SCUOLE PIU'

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

Nel 2018 è stato rimodulato il cronoprogramma dell'opera (che, ricordiamo, trova copertura su fondi ministeriali per un valore complessivo di 8milioni) in considerazione di problematiche rilevate in fase di indagini e sondaggi relativi alle definizioni delle portanze dei terreni, dell'esecuzione di complesse attività di bonifica e smaltimento di manufatti interrati e di sorgenti primarie di contaminazione, di un allungamento di tempi necessari per acquisire a verifica progettuale.

Nel 2019 si prevedono, fra le attività principali, la conclusione delle lavorazioni preliminari di bonifica, l'avvio delle procedure di gara e l'aggiudicazione dei lavori di ricostruzione.

BUDGET


2019_ZV02
ITI L: Da Vinci - Realizzazione biennio
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Conclusioni delle lavorazioni preliminari di bonifica	20,00	01/01/2019	28/02/2019	MARTINI MORENO P.O. A.B.A.BON.AM.C.ATT.	DIREZIONE SERVIZI TECNICI CANT.OB.SP.	
Attività di gara del progetto dei lavori di costruzione ai fini dell'aggiudicazione	30,00	01/03/2019	15/10/2019	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Conferimento all'esterno di incarichi professionali connessi all'esecuzione dei lavori	10,00	01/03/2019	31/12/2019	DREONI ALESSANDRO	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Affidamento e contrattualizzazione dei lavori di costruzione	30,00	01/10/2019	31/12/2019	ULIVI BRUNO - P.O. TECN.MANUTENT.QUAR. AMB. D	SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT	
Gestione dei finanziamenti esterni connessi all'investimento	10,00	01/01/2019	31/12/2019	MANDO ANTONELLA - P.O. PROGRAMMAZ. E BILANCIO	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	

2019_ZV02

ITI L: Da Vinci - Realizzazione biennio

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Fase 1: Conclusione delle lavorazioni preliminari di bonifica	RISULTATO	entro il 28/02/2019
Fase 2: Aggiudicazione dei lavori di ricostruzione	RISULTATO	entro il 15/10/2019
Fase 3: Conferimento all'esterno degli incarichi professionali	RISULTATO	entro il 31/12/2019
Fase 4: contrattualizzazione dei lavori di costruzione	RISULTATO	entro il 31/12/2019
Fase 5: Adempimenti connessi agli aspetti finanziari dell'opera pubblica: n. atti e documenti redatti (rendicontazioni, aggiornamenti, monitoraggi ecc.)	PERFORMANCE	almeno 3

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
160059	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (Patto per la città) RUP: DREONI ALESSANDRO	4.620.000,00	4.620.000,00
170070	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (q.p. a carico del Comune) RUP: DREONI ALESSANDRO	2.000.000,00	2.000.000,00
170071	ISIS L. da Vinci. Bonifica amianto e demolizione RUP: MAZZONI MICHELE	0,00	300.000,60
190126	Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci (Patto per la città) - anno 2019 RUP: DREONI ALESSANDRO	1.380.000,00	1.380.000,00
