

2017_ZG25

**Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino (Convenzioni stipulate con Ataf SpA e Tram di Firenze SpA).
Attuazione degli accordi sottoscritti con Autostrade per l'Italia.
Attuazione degli accordi sottoscritti con RFI.**

Direzione **NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'** Direttore **TARTAGLIA VINCENZO** Classificazione **DIREZIONALE**

Servizio **UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE** Dirigente **PRIORE MICHELE** Tipologia **SINTESI**

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'Amministrazione Comunale ha in corso la realizzazione del sistema integrato di tramvie nei Comuni di Firenze e Scandicci costituito dalle linee 1 (Firenze S.M.N.-Scandicci), 2 (Peretola-Piazza della Libertà) e 3 (Careggi-Bagno a Ripoli con diramazione Rovezzano).

La Linea 1 affidata mediante appalto di lavori è in fase di collaudo. A seguito di procedura di Project Financing è stata affidata alla società Tram di Firenze S.p.A. la progettazione, la realizzazione, il parziale finanziamento delle Linee 2 e 3 primo lotto e la gestione unitaria dell'intero sistema.

La finalità dell'obiettivo sono:

- espletare le attività tecniche connesse con il completamento delle opere connesse con Linea 1;
- espletare le attività tecniche connesse con la gestione di Linea 1;
- espletare le attività tecniche per realizzazione delle linee 2 e 3 primo lotto

Le attività sopra descritte sono da ricollegare principalmente al Programma e intervento rilevante della RPP(2016-2018) Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 02 "Trasporto pubblico locale" Obiettivo Strategico 03.01 "Promuovere la governance metropolitana"

Obiettivo Operativo:

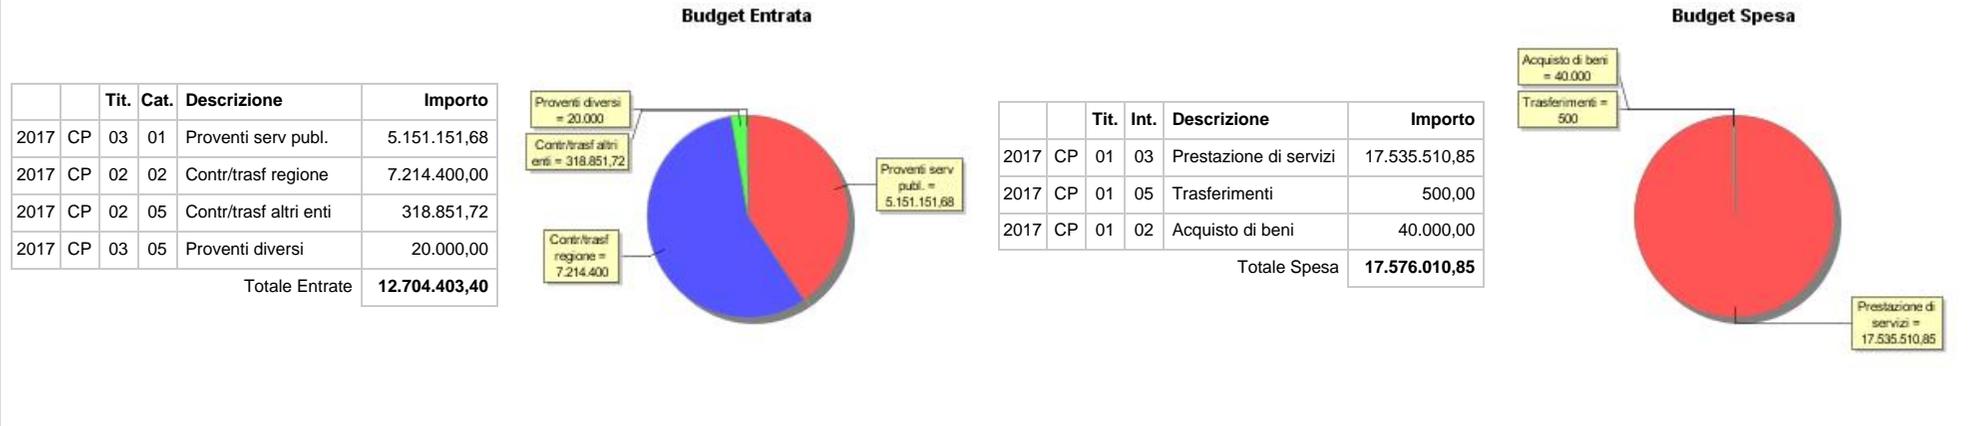
- Realizzazione delle linee tranviarie 2 e 3.

Le attività sono inoltre riferite alla verifica degli accordi sottoscritti dall'Amministrazione Comunale con Autostrade per l'Italia (ASPI) e con Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Le attività sono da ricollegare all'OBIETTIVO STRATEGICO 06.01 "Favorire la diminuzione del traffico urbano e migliorarne la gestione - Garantire comfort e sicurezza degli utenti" presente nella SEZIONE OPERATIVA del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019.

2017_ZG25

**Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino (Convenzioni stipulate con Ataf SpA e Tram di Firenze SpA).
Attuazione degli accordi sottoscritti con Autostrade per l'Italia.
Attuazione degli accordi sottoscritti con RFI.**

BUDGET

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Atti di competenza del dirigente Sottoscritti/Atti Proposti	RISULTATO	100
Atti di competenza del RUP sottoscritti/ Atti Proposti	RISULTATO	100%
Visite di controllo effettuate Linea 2	RISULTATO	0,00
SAL verificati nei tempi contrattuali o di legge/SAL da verificare. Linea 2	RISULTATO	100%
Documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge/documenti da predisporre. Linea 2	RISULTATO	100%
Visite di controllo effettuate Linea 3	RISULTATO	0,00
SAL verificati nei tempi contrattuali o di legge/SAL da verificare. Linea 3	RISULTATO	100%
Documenti predisposti nei tempi contrattuali o di legge/documenti da predisporre. Linea 3	RISULTATO	100%
Corrispettivi di gestione del servizio tranviario verificati nei tempi contrattuali o di legge/Corrispettivi da verificare. Aggiornamento registro di contabilità.	RISULTATO	100%
Report dell'attività di Verifica del Servizio Tramviario	RISULTATO	20
Aggiornamento della sezione del sito web	RISULTATO	31/12/2017

2017_ZG25

**Realizzazione del Sistema Tranviario Fiorentino (Convenzioni stipulate con Ataf SpA e Tram di Firenze SpA).
Attuazione degli accordi sottoscritti con Autostrade per l'Italia.
Attuazione degli accordi sottoscritti con RFI.**

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Definizione delle non conformità rimaste irrisolte nel Verbale Intermedio del 14/2/2012 (punto 5.5): - Usura anomala del Bivio Anulare Viali; - Rumore e usura delle ruote; - Tasso di guasto delle emettitrici; - Funzionamento impianto di Lavaggio	RISULTATO	4,00
Accordi sottoscritti con ASPI. Report semestrale dell'attività di verifica e monitoraggio delle opere e delle attività svolte. Numero relazioni svolte /numero relazioni previste	RISULTATO	100%
Accordi sottoscritti con RFI. Report semestrale dell'attività di verifica e monitoraggio delle opere e delle attività svolte. Numero relazioni svolte /numero relazioni previste	RISULTATO	100%
Accordi sottoscritti con ASPI. Efficienza gestionale dello sportello per le relazioni esterne. Garantire il 100% delle risposte alle richieste presentate entro 60gg: Risposte fornite entro 60 gg/Domande presentate	RISULTATO	100%
Accordi sottoscritti con RFI. Efficienza gestionale dello sportello per le relazioni esterne. Garantire il 100% delle risposte alle richieste presentate entro 60gg: Risposte fornite entro 60 gg/Domande presentate	RISULTATO	100%
