

2014\_PG12P

**NUOVO BY-PASS CASCINE DEL RICCIO  
NUOVO BY-PASS UGNANO-MANTIGNANO  
NUOVO BY-PASS DEL GALLUZZO**

Direzione	<b>NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</b>	Direttore	<b>TARTAGLIA VINCENZO</b>	Classificazione	<b>DIREZIONALE</b>
Servizio	<b>UFFICIO TRAMVIA INTERVENTI TAV E AUTOSTRADE</b>	Dirigente	<b>PRIORE MICHELE</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2018\_IND\_STRATEG\_06 UNA NUOVA MOBILITA'

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2018\_06IS\_OB\_STR\_01 TRAFFICO URBANO E SICUR.UTENTI

Performance **ORGANIZZATIVA**

**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della realizzazione dell'intervento di adeguamento a 3 corsie dell'Autostrada A1 nel tratto Firenze Nord-Firenze Sud, ha sottoscritto con Società Autostrade SpA specifici accordi, in cui è previsto l'impegno di Società Autostrade a realizzare infrastrutture funzionali al miglioramento dei collegamenti in ambito cittadino.

Nei suddetti accordi, Società Autostrade si è impegnata a progettare e finanziare la realizzazione dei seguenti interventi: By-Pass del Galluzzo, Parcheggio Certosa, Svincolo di Peretola, Viadotto di Varlungo.

Per gli interventi: By-Pass Cascine del Riccio, Viabilità Mantignano Ugnano, come previsto negli accordi sottoscritti, l'A.C. realizzerà direttamente tali opere.


Le finalità dell'obiettivo sono quelle di pervenire progressivamente all'apertura del By-Pass del Galluzzo di competenza di Società Autostrade per L'Italia e dei due By-Pass di Cascine del Ricci e Mantignano Ugnano di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Le attività sopra descritte sono da ricollegare all'OBIETTIVO STRATEGICO 06.01 "Favorire la diminuzione del traffico urbano e migliorarne la gestione - Garantire comfort e sicurezza degli utenti" presente nella SEZIONE OPERATIVA del DOCUMENTO UNIICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.

2014\_PG12P

NUOVO BY-PASS CASCINE DEL RICCIO  
NUOVO BY-PASS UGNANO-MANTIGNANO  
NUOVO BY-PASS DEL GALLUZZO

**GANTT**

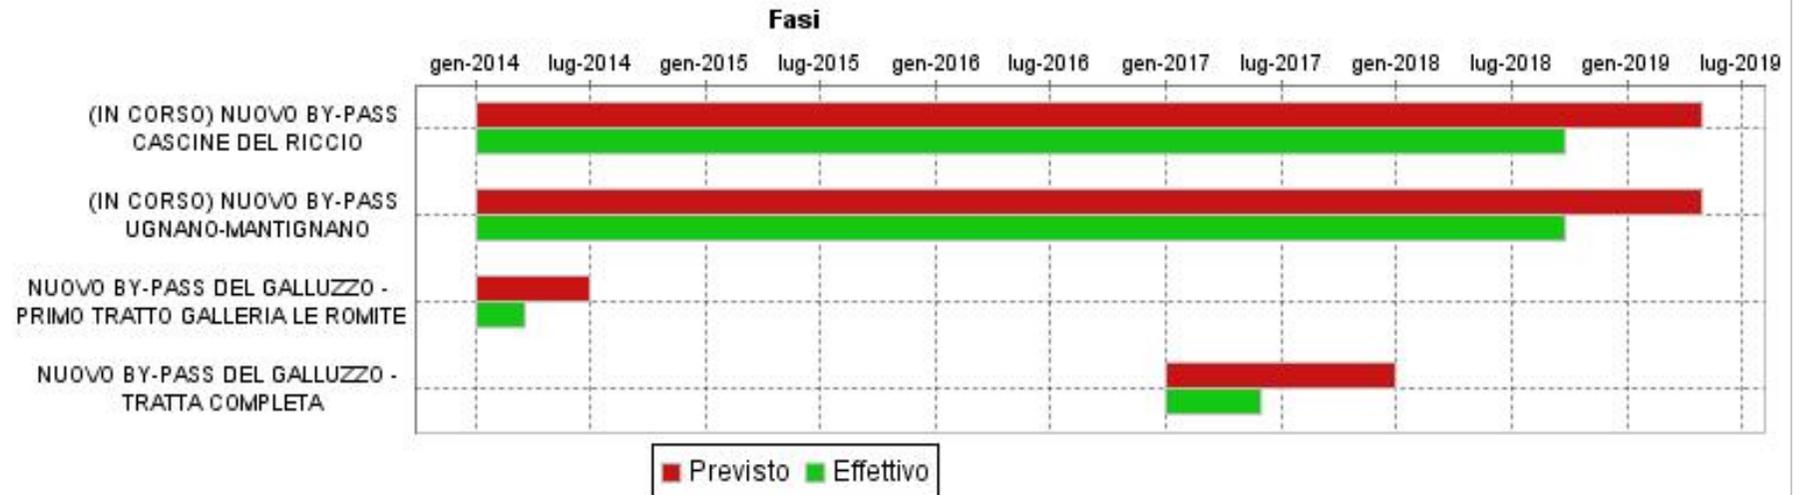

**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
NUOVO BY-PASS CASCINE DEL RICCIO	50,00	01/01/2014	30/04/2019	P.O. INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADE	Aggiudicazione Definitiva, Sottoscrizione Contratto, Avvio Lavori, Esecuzione Lavori, Messa in esercizio e collaudo provvisorio dell'infrastruttura. Al 31/12/2017 lavori in corso.

**2014\_PG12P**
**NUOVO BY-PASS CASCINE DEL RICCIO  
NUOVO BY-PASS UGNANO-MANTIGNANO  
NUOVO BY-PASS DEL GALLUZZO**

<b>FASI</b>						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
NUOVO BY-PASS UGNANO-MANTIGNANO	40,00	01/01/2014	30/04/2019	P.O. INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADALE	Aggiudicazione Definitiva, Sottoscrizione Contratto, Avvio Lavori, Esecuzione Lavori, Messa in esercizio e collaudo provvisorio dell'infrastruttura. Prima tratta lavori messa in esercizio il 28/05/2017. Per la seconda tratta i lavori in corso al 31/12/201
NUOVO BY-PASS DEL GALLUZZO - PRIMO TRATTO GALLERIA LE ROMITE	10,00	01/01/2014	30/06/2014	P.O. INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI	SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADALE	Apertura al traffico del primo tratto del By-Pass (rotatoria via Senese - galleria Le Romite - rotatoria Bagnese)
NUOVO BY-PASS DEL GALLUZZO - TRATTA COMPLETA		01/01/2017	31/12/2017		SERV.TRAMVIA TAV E AUTOSTRADALE	Messa in esercizio dell'intera tratta il 29/05/2017

<b>INDICATORI</b>		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
2014 - Avvio dei lavori BY-PASS CASCINE DEL RICCIO	RISULTATO	30/08/2014
2014 - Apertura al traffico del primo tratto BY-PASS DEL GALLUZZO	RISULTATO	30/06/2014
2015 - Atti connessi con l'Esecuzione Lavori BY-PASS CASCINE DEL RICCIO	RISULTATO	100%
2015 - Avvio Lavori BY-PASS UGNANO MANTIGNANO	RISULTATO	28/02/2015
2015 - Esecuzione Lavori BY-PASS UGNANO MANTIGNANO	RISULTATO	20/12/2016
2015 - Atti connessi con l'Esecuzione Lavori BY-PASS MANTIGNANO UGNANO	RISULTATO	100%
2016 - Atti connessi con l'Esecuzione Lavori BY-PASS CASCINE DEL RICCIO	RISULTATO	100%
2016 - Esecuzione Lavori BY-PASS UGNANO MANTIGNANO	RISULTATO	30/03/2017

**2014\_PG12P****NUOVO BY-PASS CASCINE DEL RICCIO  
NUOVO BY-PASS UGNANO-MANTIGNANO  
NUOVO BY-PASS DEL GALLUZZO****INDICATORI**

<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
2016 - Esecuzione Lavori BY-PASS CASCINE DEL RICCIO	RISULTATO	30/03/2017
2017 - Esecuzione lavori e messa in esercizio BY-PASS CASCINE DEL RICCIO	RISULTATO	31/12/2017
2017 - Esecuzione lavori e messa in esercizio BY-PASS UGNANO MANTIGNANO	RISULTATO	31/12/2017
2018- Atti connessi con l'esecuzione Lavori BY-PASS CASCINE DEL RICCIO	RISULTATO	100%
2018- Atti connessi con l'esecuzione Lavori BY-PASS MANTIGNANO UGNANO	RISULTATO	100%
2019 - Atti connessi all'approvazione collaudo provvisorio BY-PASS CASCINE DEL RICCIO	RISULTATO	30/04/2019
2019 - Atti connessi all'approvazione collaudo provvisorio BY-PASS UGNANO MANTIGNANO	RISULTATO	30/04/2019
