

2017_ZG19P**Riqualificazione di aree cittadine e interventi di riqualificazione arredo urbano**

Direzione	NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Direttore	TARTAGLIA VINCENZO	Classificazione	DIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI	Dirigente	CARONE GIUSEPPE	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2018_06IS_OB_STR_01 TRAFFICO URBANO E SICUR.UTENTIPerformance **ORGANIZZATIVA****Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**


L'obiettivo è finalizzato alla valorizzazione degli interventi di riqualificazione e decoro degli spazi urbani; si pone attenzione al mantenimento della qualità delle pavimentazioni lapidee e dell'arredo urbano, al recupero di aree urbane a nuove funzioni ed a realizzare interventi di miglioramento della funzionalità e qualità degli spazi urbani.

Le attività dell'obiettivo riguardano in particolare il completamento di attività progettuali o l'avvio di appalti (Piazza delle cure, via gioberti, piazza vittorio veneto, piazza goldoni, dissuasori mobili).

2017_ZG19P

Riqualificazione di aree cittadine e interventi di riqualificazione arredo urbano

GANTT

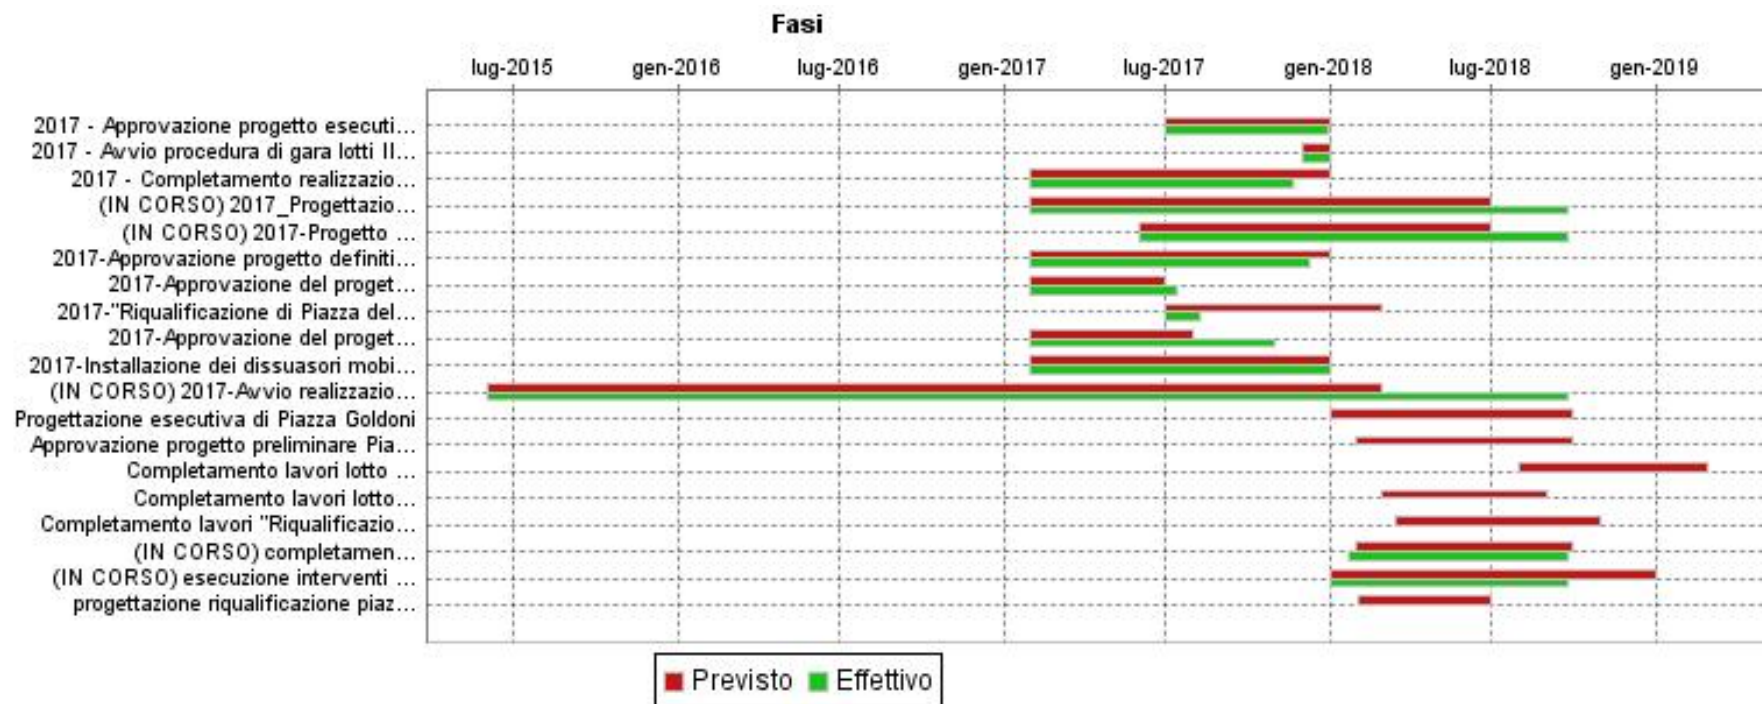

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2017 - Approvazione progetto esecutivo lotti II e III interventi di sistemazione porta al Prato Piazza Vittorio Veneto		01/07/2017	31/12/2017	BARABESI MAURIZIO-P.O. RIQUALIFICAZ. SPAZI URBANI	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	delibera di giunta 2017/G/00669
2017 - Avvio procedura di gara lotti II e III interventi di sistemazione porta al Prato Piazza Vittorio Veneto		01/12/2017	31/12/2017	BARABESI MAURIZIO-P.O. RIQUALIFICAZ. SPAZI URBANI	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	delibera di giunta 2017/G/00669

2017_ZG19P

Riqualificazione di aree cittadine e interventi di riqualificazione arredo urbano

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2017 - Completamento realizzazione lavori di Riqualificazione di Piazza de Nerli		30/01/2017	31/12/2017	BARABESI MAURIZIO-P.O. RIQUALIFICAZ. SPAZI URBANI	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	come da verbale di fine lavori
2017_Progettazione esecutiva di Piazza Goldoni		31/01/2017	30/06/2018	BARABESI MAURIZIO-P.O. RIQUALIFICAZ. SPAZI URBANI	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2017-Progetto di riqualificazione architettonica e funzionale di Piazzale Michelangelo		01/06/2017	30/06/2018	BARABESI MAURIZIO-P.O. RIQUALIFICAZ. SPAZI URBANI	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
2017-Approvazione progetto definitivo Via Palazzuolo		31/01/2017	31/12/2017		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	approvato con delibera di giunta 577/2017
2017-Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di "Riqualificazione di Piazza delle Cure"		31/01/2017	30/06/2017	BARABESI MAURIZIO-P.O. RIQUALIFICAZ. SPAZI URBANI	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	avvenuta con delibera di giunta 331 del 12/07/2017
2017-"Riqualificazione di Piazza delle Cure" Emissione del bando di gara, aggiudicazione dell'appalto ed avvio dei lavori		01/07/2017	28/02/2018	BARABESI MAURIZIO-P.O. RIQUALIFICAZ. SPAZI URBANI	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	approvato bando con DD 5456/2017
2017-Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento "Riqualificazione Via Gioberti " Codice Opera 120027		31/01/2017	30/07/2017	BARABESI MAURIZIO-P.O. RIQUALIFICAZ. SPAZI URBANI	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	approvato con delibera di giunta 2017/G/00483
2017-Installazione dei dissuasori mobili di cui al c.o. 150364		31/01/2017	31/12/2017	BARABESI MAURIZIO-P.O. RIQUALIFICAZ. SPAZI URBANI	SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	affidato a fratelli ferrara con DD 5997/2017
2017-Avvio realizzazione interventi di riqualificazione marciapiede di via Bolognese		01/06/2015	28/02/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Progettazione esecutiva di Piazza Goldoni		01/01/2018	30/09/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	fase confluita dall'obiettivo 2017_ZG19 - Riqualificazione aree cittadine

2017_ZG19P

Riqualificazione di aree cittadine e interventi di riqualificazione arredo urbano

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Approvazione progetto preliminare Piano Città - piazza vittorio veneto		31/01/2018	30/09/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Completamento lavori lotto II "Riqualificazione di Piazza delle Cure"		01/08/2018	28/02/2019		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Completamento lavori lotto I "Riqualificazione di Piazza delle Cure"		01/03/2018	31/08/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
Completamento lavori "Riqualificazione Via Gioberti " Codice Opera 120027		15/03/2018	30/10/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
completamento installazione dei dissuasori mobili di cui al c.o. 150364		30/01/2018	30/09/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
esecuzione interventi di riqualificazione urbana		01/01/2018	31/12/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	c.o. 150064
progettazione riqualificazione piazza salvemini		01/02/2018	30/06/2018		SERV.PROGR.MOB.PIST.CICL.	
INDICATORI						
Descrizione	Tipo		Valore Atteso			
2017 - n. approvazione progetti riqualificazione urbana	RISULTATO		4,00			
2017 - avvio dei lavori di interventi di riqualificazione urbana	RISULTATO		2			
2018 - n. approvazione progetti riqualificazione urbana	RISULTATO		2,00			
2018 - avvio dei lavori di interventi di riqualificazione urbana	RISULTATO		4			
