ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	**Riunione REGIONE/ARPAT/PROVINCIA/COMUNE Gestione materiali di risulta dep**	0 g	gio 03/11/11	gio 03/11/11	
2	**Verbale accordo Concessionario/Concedente/Enti Finanziatori**	0 g	mer 30/11/11	mer 30/11/11	
3	**Variante Dalmazia-Rifredi-Pisacane**	**670 g**	**mer 17/08/11**	**lun 17/06/13**	
4	Redazione Progetto Preliminare	90 g	mer 17/08/11	mar 15/11/11	
5	**Procedura di assoggettabilità LR 10/2010**	100 g	mar 15/11/11	gio 23/02/12	4
6	Approvazione da parte del Concedente	60 g	gio 23/02/12	lun 23/04/12	5
7	Approvazione Variante Urbanistica	180 g	lun 23/04/12	sab 20/10/12	6
8	Redazione Progetto Definitivo	60 g	lun 23/04/12	ven 22/06/12	6
9	Conferenza dei Servizi	45 g	ven 22/06/12	lun 06/08/12	8
10	**Approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**	90 g	lun 06/08/12	dom 04/11/12	9
11	Approvazione da parte del Concedente	60 g	dom 04/11/12	gio 03/01/13	10;7FF
12	**Stipula contratto Concedente/Concessionario e revisione PEF**	45 g	gio 03/01/13	dom 17/02/13	11
13	Redazione Progetto Esecutivo	60 g	dom 17/02/13	gio 18/04/13	12
14	Approvazione Progetto Esecutivo	60 g	gio 18/04/13	lun 17/06/13	13
15	**Variante alternativa centro storico (incluso Valfonda-Rosselli-compl. L1)**	**790 g**	**dom 21/08/11**	**sab 19/10/13**	
16	Redazione revisione Studio di Fattibilità	60 g	dom 21/08/11	gio 20/10/11	
17	Approvazione da parte del Concedente + CDS	60 g	gio 20/10/11	lun 19/12/11	16
18	Redazione Progetto Preliminare	60 g	lun 19/12/11	ven 17/02/12	17
19	**Procedura di assoggettabilità LR 10/2010**	100 g	ven 17/02/12	dom 27/05/12	18
20	Approvazione da parte del Concedente	60 g	dom 27/05/12	gio 26/07/12	19
21	Approvazione Variante Urbanistica	180 g	gio 26/07/12	mar 22/01/13	20
22	Redazione Progetto Definitivo	90 g	gio 26/07/12	mer 24/10/12	20
23	Conferenza dei Servizi	45 g	mer 24/10/12	sab 08/12/12	22
24	**Approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**	90 g	sab 08/12/12	ven 08/03/13	23
25	Approvazione da parte del Concedente	60 g	ven 08/03/13	mar 07/05/13	24;21FF
26	**Stipula contratto Concedente/Concessionario e revisione PEF**	45 g	mar 07/05/13	ven 21/06/13	25
27	Redazione Progetto Esecutivo	60 g	ven 21/06/13	mar 20/08/13	26
28	Approvazione Progetto Esecutivo	60 g	mar 20/08/13	sab 19/10/13	27
29	**Progettazione Varianti Statuto e Belfiore**	90 g	mer 27/07/11	lun 24/10/11	
30		**75 g**	**sab 01/10/11**	**mer 14/12/11**	
31	Consegna Progettazione Cantiere A.1 (1°fase)	1 g	ven 04/11/11	ven 04/11/11	
32	Approvazione Progettazione Cantiere A.1 (1°fase)	1 g	ven 04/11/11	ven 04/11/11	
33	Consegna Aree Cantiere A.1 (1°fase)	0 g	ven 04/11/11	ven 04/11/11	
34	Adeguamento Progetto Esecutivo Cantieri A.1/F	45 g	sab 01/10/11	lun 14/11/11	1FI-38 g
35	Approvazione Progetto Esecutivo cantieri A.1/F	30 g	mar 15/11/11	mer 14/12/11	34
36	Piano di caratterizzazione siti inquinati	30 g	sab 15/10/11	lun 14/11/11	
37	**Approvazione piano di caratterizzazione siti inquinati**	30 g	lun 14/11/11	mer 14/12/11	36
38	Presentazione Progetto cantiere G.1 comune di Scandicci	0 g	mer 26/10/11	mer 26/10/11	
39	**LAVORI LINEA 2**	**1000,13 g**	**ven 04/11/11**	**gio 31/07/14**	
40	Cantiere A.1 opere prodeutiche (bonifica BCM + altro)	65 g	sab 05/11/11	dom 08/01/12	33
41	Cantiere A1 (Trincea Guidoni)	960 g	gio 15/12/11	gio 31/07/14	40I+30 g;35;2
42	Adeguamento Progetto Esecutivo esclso cantiere B3 AV	57 g	ven 04/11/11	sab 31/12/11	
43	Approvazione Progetto Esecutivo Cantieri A.2, A.3, B.1, B.2	30 g	sab 31/12/11	lun 30/01/12	42
44	Approvazione Progetto Esecutivo Cantieri C.1, C.2, C.3	60 g	sab 31/12/11	mer 29/02/12	42
45	Approvazione Progetto Cantiere G.1	85 g	sab 05/11/11	sab 28/01/12	38FI+10 g
46	Cantiere A2 (Novoli)	731 g	gio 28/06/12	dom 29/06/14	43FI+150 g;2
47	Cantiere A3 (Novoli)	464 g	mer 01/02/12	gio 09/05/13	43;2
48	Cantiere B1 (S. Donato)	702 g	mer 01/02/12	gio 02/01/14	43;2
49	Cantiere B2 (Gordigiani-Buonsignori)	491 g	mer 01/02/12	mer 05/06/13	43;2
50	Adeguamento Progetto Esecutivo cantiere B.3 AV	60 g	ven 06/07/12	mar 04/09/12	
51	Approvazione Progetto Esecutivo cantiere B.3 AV	60 g	mer 05/09/12	dom 04/11/12	50
52	Cantiere B3 (Alta velocità)	587 g	lun 05/11/12	sab 14/06/14	2;51
53	Cantiere C1 (Belfiore)	547 g	mar 01/05/12	mar 29/10/13	2;44
54	Cantiere C2 (Alamanni)	379 g	lun 17/06/13	lun 30/06/14	2;44
55	Cantiere C3 (Guido Monaco)	451 g	ven 05/04/13	lun 30/06/14	2;44
56	Cantiere G1 (Ampliamento deposito)	885 g	dom 29/01/12	mar 01/07/14	2;45
57	Cantiere C.4 F.lli Rosselli	354 g	lun 07/01/13	gio 26/12/13	
58	Prove, preesercizio e rilascio nulla osta	90 g	ven 01/08/14	mer 29/10/14	41
59					
60	Adeguamento PE Variante Milton-Strozzi per CCP	90 g	mar 06/09/11	lun 05/12/11	
61	Approvazione Variante Milton-Strozzi	60 g	lun 05/12/11	ven 03/02/12	60
62	**LAVORI LINEA 3**	**1216 g**	**mar 17/01/12**	**sab 16/05/15**	**2**
63	Cantiere A1 (Milton-Strozzi)	1198 g	sab 04/02/12	sab 16/05/15	35;61
64	Cantiere B (Statuto)	880 g	lun 09/07/12	ven 05/12/14	
65	Cantiere C (Gianni-Tavanti)	811 g	ven 30/03/12	mer 18/06/14	37
66	Cantiere D (V. Emanuele)	593 g	lun 07/01/13	ven 22/08/14	
67	Cantiere E (Corridoni-Pisacane)	604 g	lun 29/07/13	mar 24/03/15	37
68	Cantiere F (Morgagni)	856 g	mar 17/01/12	mer 21/05/14	35
69	Completamento Finiture e Tecnologie	30 g	dom 17/05/15	lun 15/06/15	63
70	Prove, preesercizio e rilascio nulla osta	60 g	mar 16/06/15	ven 14/08/15	69
71	**LAVORI ALTERNATIVA CENTRO STORICO**	**619 g**	**sab 19/10/13**	**mar 30/06/15**	**28**
72	Cantiere A2 (Beslan-Strozzi)	300 g	sab 19/10/13	ven 15/08/14	
73	Cantiere D (Valfonda)	360 g	sab 19/10/13	mar 14/10/14	
74	Cantiere E (Lavagnini)	619 g	sab 19/10/13	mar 30/06/15	
75	Cantiere F (Libertà-S. Marco)	619 g	sab 19/10/13	mar 30/06/15	
76	**VARIANTE DALMAZIA-RIFREDI-PISACANE Cantiere D'-E'**	**604 g**	**lun 17/06/13**	**mer 11/02/15**	**14;37**
77	Completamento prove, preesercizio e rilascio nulla osta	60 g	mar 30/06/15	sab 29/08/15	75
78	**Materiale Rotabile**	**1308 g**	**sab 03/09/11**	**ven 03/04/15**	
79	Studio di fattibilità variante Gap Filler	60 g	sab 03/09/11	mer 02/11/11	
80	Approvazione ariante Gap Filler	40 g	gio 03/11/11	lun 12/12/11	79
81	Materiale rotabile Linea 2	960 g	mar 13/12/11	mar 29/07/14	80;2
82	Materiale rotabile Linea 3	980 g	ven 27/07/12	ven 03/04/15	2,80

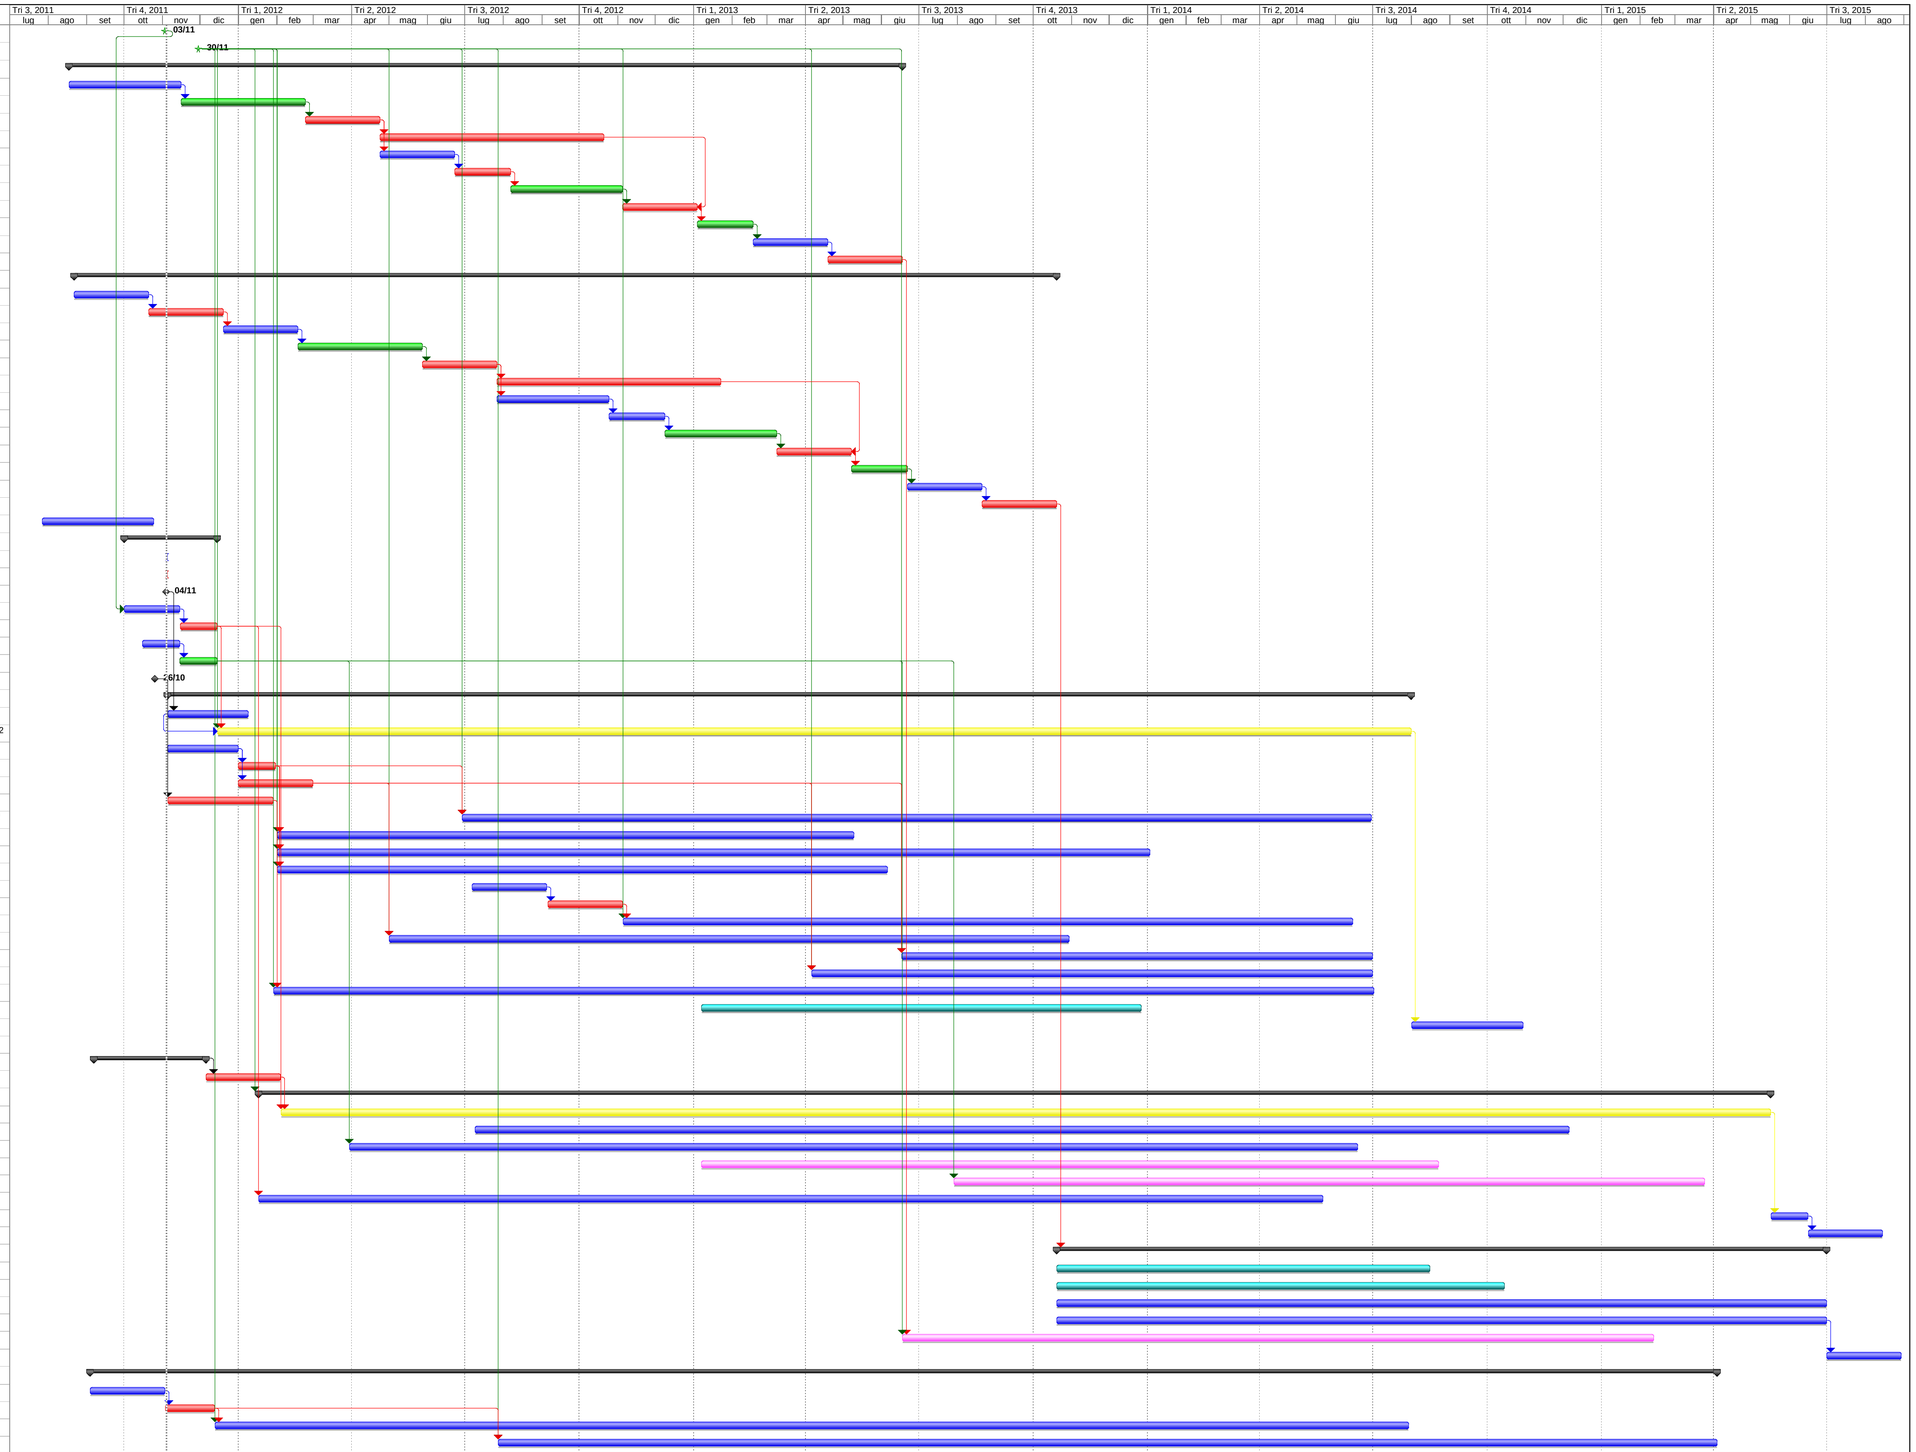

Progetto: Crono comune rev01
Data: ven 04/11/11

Attività · Divisione · Avanzamento · Cardine · Riepilogo · Riepilogo progetto · Attività esterne · Cardine esterno · Scadenza

Ulteriore Accelerazione
